

## DIARIO DE BORDO

# #noisqueta

PARA TRANSFORMAR

NOVOS HERDEIROS HUMANÍSTICOS



Hoje o nosso coração esta saltando de alegria, é um misto de sentimentos.

Deixar para trás um local simples que nos acolheu com muito amor.

Aqui vivemos dias desafiadores e demos passos firmes para a construção de uma base sólida de transformação humana em nossa região.

(Coordenadora Rosimeire )

**06 DE JULHO**



**NOVOS HERDEIROS**  
**Humanísticos**

INICIANDO ...



R. Mario Grazini, 100  
Cursino - São Paulo/SP  
04153-150



# 06 DE JULHO

A equipe do Kiko Construções já chegou soltando o braço, não deram moleza e já começaram a quebradeira, a ideia é até sexta feira quebrar tudo o que precisa e na próxima semana iniciar o enquadramento de portas janelas etc.



# 06 DE JULHO

Recebemos a visita do nosso parceiro e conselheiro Fabio Villas e da nossa querida colaboradora e parceira Keh Correa, além do Coordenador de Cultura o Ricardo Ragu da Sub Prefeitura do Ipiranga.



# 07 DE JULHO

Cumprindo o cronograma hoje pela manhã, chegou os materiais 1000 tijolos 2 mts areia 10 cimento, Ferro, Tabuas e pedra .



# 08 DE JULHO

A equipe deu continuidade a quebradeira e com muita eficiência já começou aparecer as portas das novas salas



# 09 DE JULHO

A equipe liderada pelo empreiteiro Kiko continuou com a execução da demolição das alvenarias onde serão instaladas os novos acessos e aberturas para iluminação e ventilação da edificação.



# 10 DE JULHO

Conclusão da demolição





# 11 DE JULHO

Limpeza do entulho.




# 12 DE JULHO

Hoje recebemos o nosso mestre Dani Hirano o “ Pitangui” da obra, nosso arquiteto responsável por esse projeto incrível junto com a Laura Paes nossa maestra que esta nos bastidores. E também começamos a requadrar as janelas e portas



# 12 DE JULHO

Quebradeira da parte externa

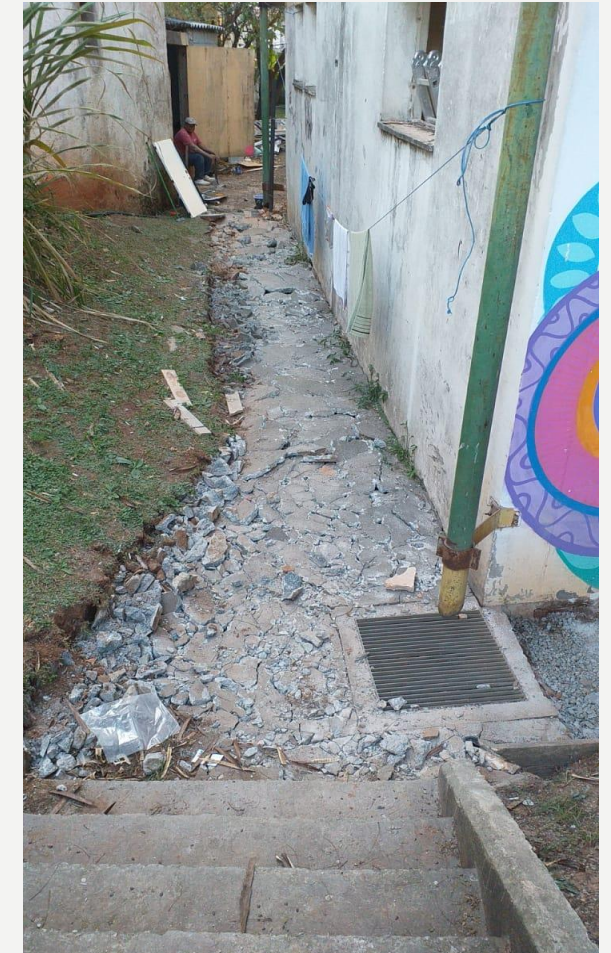

# 13 DE JULHO

## SUBINDO PAREDES & REQUADRANDO

Hoje completamos 1 semana de reforma e tudo esta dentro do nosso planejado, a equipe trabalhando de forma sincronizada e estamos fechando essa primeira semana sem acidente ou incidente.

A Kiko Empreiteira iniciou hoje o alargamento do corredor, fez a movimentação de terra e planou parte do muro que temos ao lado esquerdo da nossa edificação, aqui será a parte pensada na acessibilidade dos cadeirantes e do nosso publico da melhor idade.



## SUBINDO PAREDES & REQUADRANDO



**14 DE JULHO**

**CONCLUSÃO DOS FECHAMENTOS &  
REQUADRAMENTO**



**15 DE JULHO**

**EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS DOS  
BANHEIROS E COPA**



**16 DE JULHO**

# **FINALIZAÇÃO DOS ENQUADRAMENTOS**





**17/18 DE  
JULHO**

# **FINALIZAÇÃO DOS ENQUADRAMENTOS INTERNOS**




# 19 DE JULHO

## INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA FUTURA ARQUIBANCADA.



Dando início a segunda semana, a Kiko Empreiteira iniciou hoje a movimentação de terra onde será destinada a futura arquibancada, nesta etapa toda terra retirada será reutilizada para nivelar parte do terreno atrás da edificação. Parte do que hoje se destina ao estacionamento será transformado em um espaço de integração social para eventos realizados na ONG NOVOS HERDEIROS.

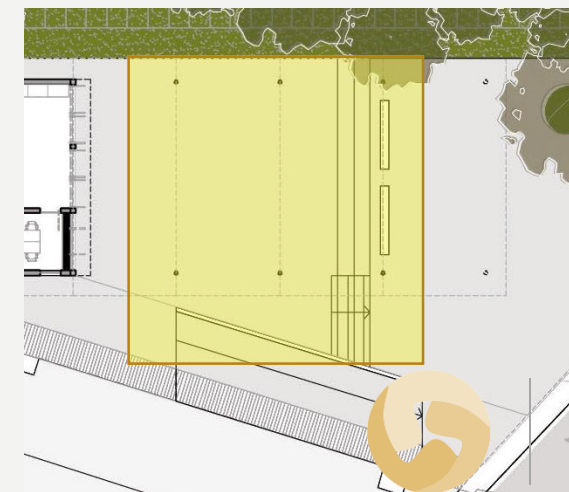

# 20 DE JULHO

## MURO DE ARRIMO



Preparação para executar a fundação do muro de arrimo, o mesmo garantirá a estabilidade do solo com relação a edificação e promoverá mais segurança para todos.



**21 DE JULHO**

# **EXECUÇÃO DOS BANHEIROS**



**22 DE JULHO**

# **CONTINUAÇÃO DEMOLIÇÃO DO PISO ESTACIONAMENTO**



**23 DE JULHO**

# **EXECUÇÃO FUNDAÇÃO DO MURO**



Escavação das brocas de fundação do muro de arrimo mais montagem da armadura estrutural.



**24 DE JULHO**

# **LIMPEZA DA LAJE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO**



Processo de limpeza da laje para ser realizado o nivelamento e a impermeabilização proporcionando uso de atividades no futuro.



**25 DE JULHO**

# **EXECUÇÃO MURO DE ARRIMO**



Chegada dos materiais e início da execução do arrimo.

Doação Telha Norte 50 Blocos + 1 Porta

**telhanorte**





**26 DE JULHO**

**CONTINUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO  
DE TERRA NO ESTACINAMENTO**



**27 DE JULHO**

# **CONTINUAÇÃO DAS EXECUÇÕES MURO E LAJE**



**PARA MANIFESTAR NOSSA GRATIDÃO E CELEBRAR A ESSA CONQUISTA  
CONTRATAMOS A @TATYDOCES QUE NOS FORNECERA TODA SEMANA 1  
DELICIOSO BOLO SE DELICIE POIS E DE DAR AGUA NA BOCA**





**COMPLETAMOS 3  
SEMANAS E TUDO  
SÓ FOI POSSIVÉL  
COM VOCÊ.**

VAMOS RELEMBRAR

# RECORDAR É VIVER



# EXP NHH

PROJETO - PLANTA -  
SETORIZAÇÃO



*Implantação do projeto arquitetônico finalizado em todas suas fases de execução – Sem escala*

## LEGENDA

- 1. ESTAÇÃO ELÉTRICA
- 2. HORTA
- 3. PRAÇA ELEVADA
- 4. ACESSO PRINCIPAL

- 5. TOTEM INFORMATIVO
- 6. RAMPA ACESSÍVEL
- 7. ANFITEATRO / ESPAÇO COMUNITÁRIO
- 8. SEDE DA ONG / ADM / COPA

- 9. SANITÁRIOS / VESTIÁRIOS / DEPÓSITO
- 10. SALA DE CURSOS
- 11. BIBLIOTECA / ESTUDIO
- 12. AUDITÓRIO / OUTROS
- 13. PRAÇA ARBORIZADA





# OBRIGADO

Acesse: [www.novosherdeiros.com.br](http://www.novosherdeiros.com.br) e acompanhe nossa prestação de contas

“UNIR-SE É UM BOM COMEÇO, MANTER A  
UNIÃO É UM PROGRESSO, E TRABALHAR EM  
CONJUNTO É A VITÓRIA” - DARWIN, CH.
